

SAP S/4HANA-Einführung bei einem mittelständischen Handelsunternehmen

Konzeptstudie: Prozessanalyse, Soll-Konzept und Projektplanung für eine fiktive ERP-Einführung.

Prozessmodellierung

Fit-Gap-Analyse

Risikomanagement

Stakeholder-Analyse

Projektplanung

150

Mitarbeitende

3

getrennte Systeme im Ist-Zustand

~13 Wochen

geplante Projektlaufzeit

5

identifizierte Risiken

Eymen Gülmez

Wirtschaftsinformatik · FH Dortmund

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Ausgangslage	3
Mein Vorgehen	3
Ist-Prozess	4
Schwachstellen	5
Soll-Konzept	6
Projektplanung	7
Risikomatrix	8
Stakeholder-Analyse	9
Erwarteter Nutzen	10
Was ich daraus mitnehme	10

Fiktives Fallbeispiel zur Veranschaulichung von Vorgehen und Methodik.
Unternehmen und Kennzahlen sind frei erfunden.

Ausgangslage

Die "NordHandel GmbH" (fiktiv), ein Großhändler mit rund 150 Mitarbeitenden, steuert Einkauf, Lager und Rechnungswesen über drei getrennte Systeme: Bestellungen laufen über Excel-Listen, der Wareneingang wird separat im Lager erfasst, Rechnungen werden manuell dagegen geprüft. Das Ergebnis: doppelte Datenpflege, keine Echtzeit-Bestandsübersicht und ein Monatsabschluss, der regelmäßig zu spät kommt.

Mein Vorgehen

Vier Schritte, bevor überhaupt über konkrete Systemkonfiguration gesprochen wird.

01

Anforderungen aufnehmen

(Fiktive) Gespräche mit Einkauf, Lager und Buchhaltung, um die tatsächlichen Pain Points zu verstehen, nicht nur die vermuteten.

02

Ist-Prozess modellieren

Den bestehenden Ablauf als Flowchart dokumentieren, um Medienbrüche und Schwachstellen sichtbar zu machen.

03

Fit-Gap-Analyse

Abgleich zwischen den Anforderungen und dem SAP-Standard, um zu klären, wo Customizing wirklich nötig ist.


04

Konzept & Planung

Soll-Prozess, Zeitplan, Risiken und Stakeholder definieren, bevor die eigentliche Umsetzung beginnt.

Ist-Prozess

Der aktuelle Beschaffungsprozess, Schritt für Schritt.

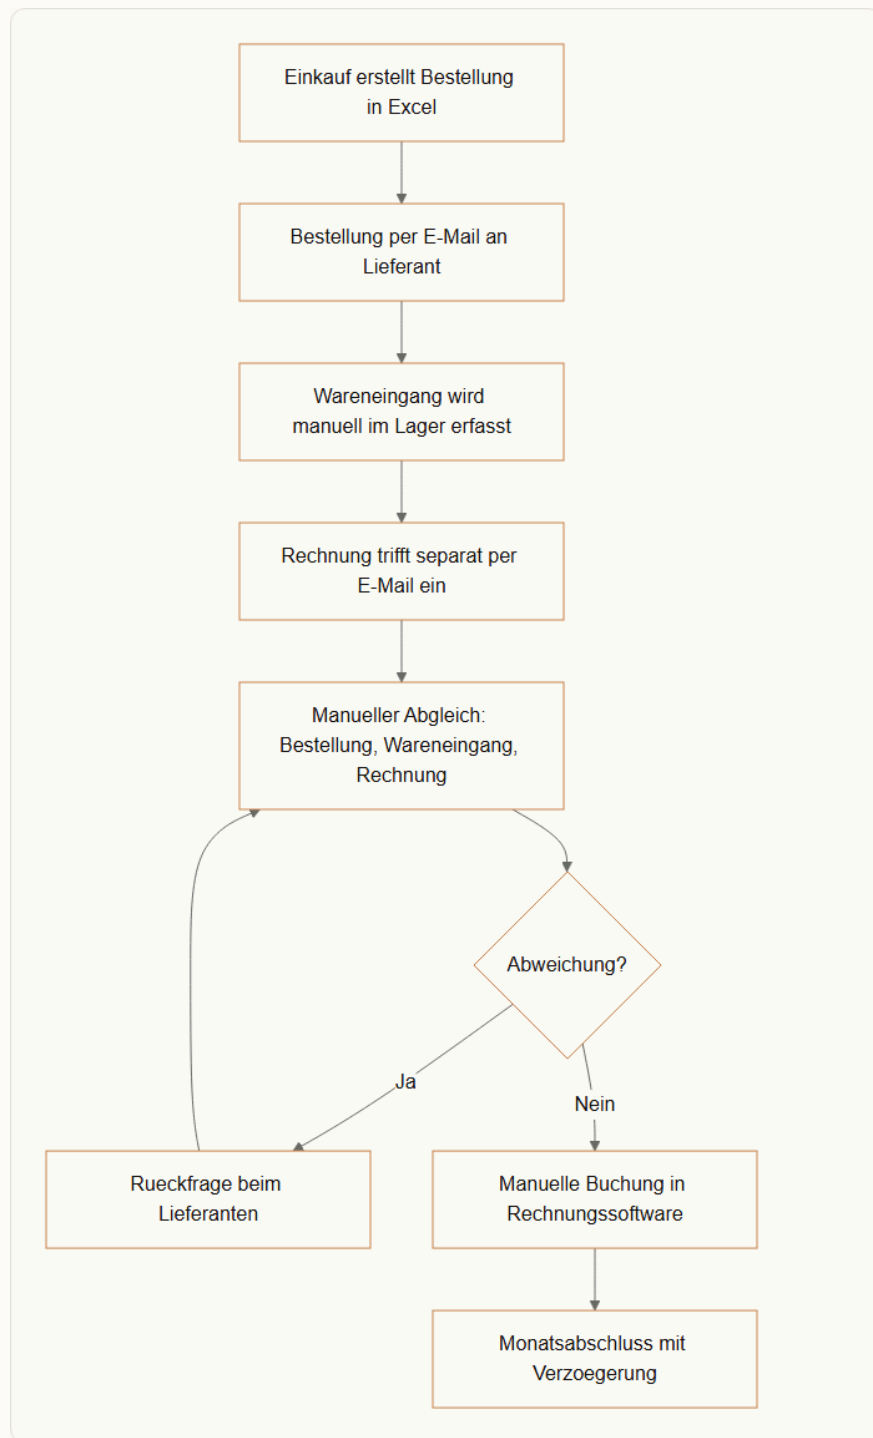

Schwachstellen

Medienbrüche zwischen Excel, E-Mail
und Rechnungssoftware


Keine Echtzeit-Bestandstransparenz
für Einkauf und Vertrieb

Hoher manueller Aufwand und
Fehlerquote beim Rechnungsabgleich

Keine einheitliche Datenbasis für
Reporting und Kennzahlen


Soll-Konzept

Einführung von SAP S/4HANA mit integrierten Modulen für Einkauf (MM), Lager und Finanzbuchhaltung (FI). Ein automatischer 3-Way-Match ersetzt den manuellen Abgleich, alle Abteilungen arbeiten auf derselben Datenbasis.

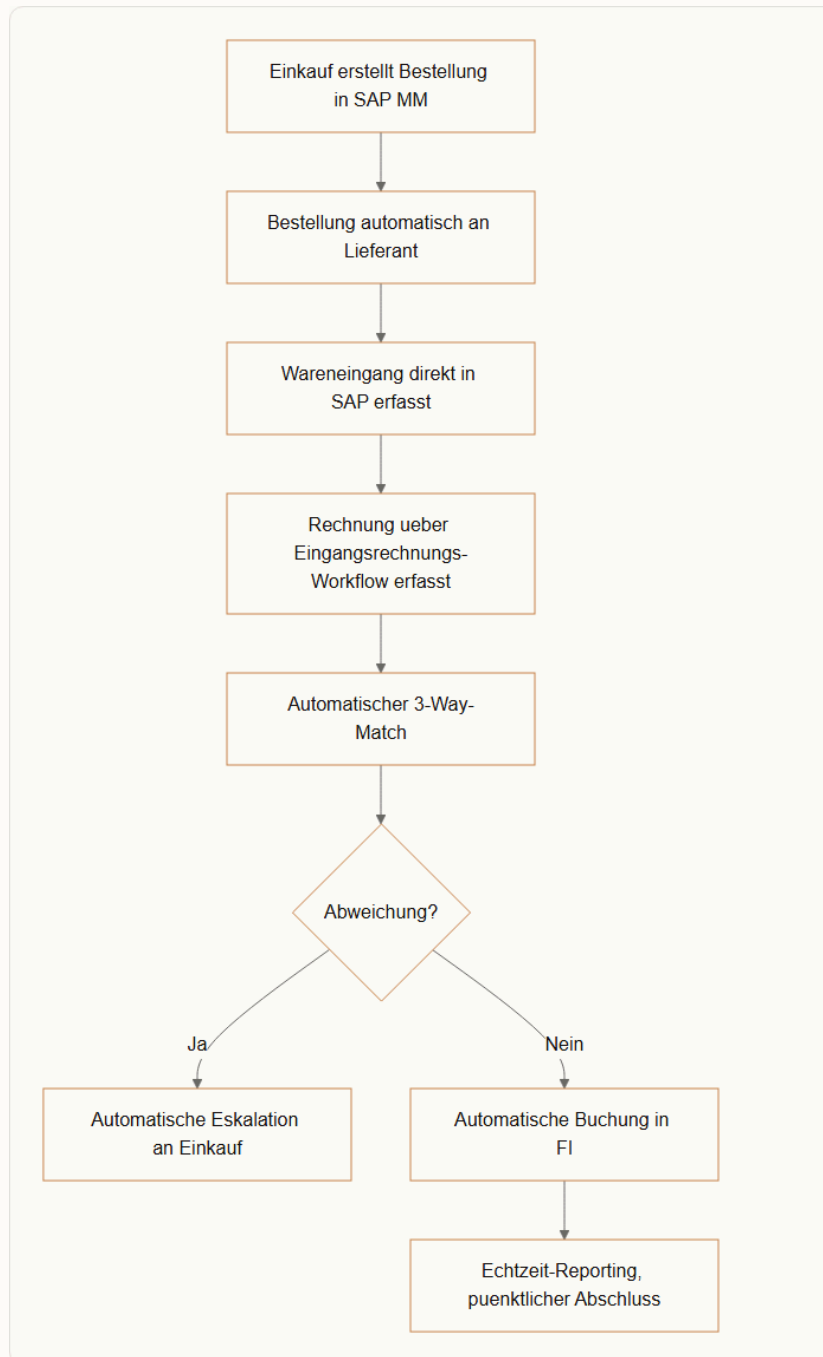

Projektplanung

Grobplanung über sechs Phasen, von der Analyse bis zur Hypercare-Phase nach Go-Live.

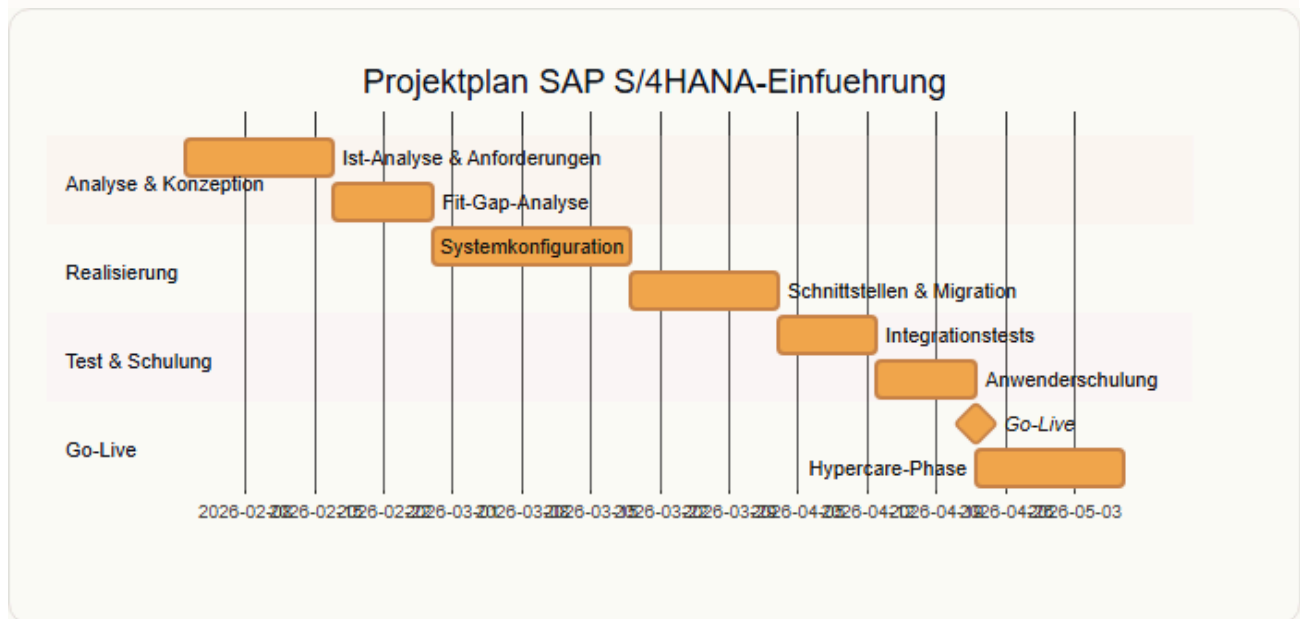

Risikomatrix

Risiko	Wahrsch.	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Datenmigrationsfehler bei Bestands- und Stammdaten	Mittel	Hoch	Frühzeitige Datenbereinigung, mehrere Test-Migrationen vor Go-Live
Akzeptanzprobleme bei Mitarbeitenden	Hoch	Mittel	Frühe Einbindung der Fachbereiche, Key-User-Konzept, gezielte Schulungen
Verzögerung durch Schnittstellenprobleme	Mittel	Mittel	Frühzeitige Schnittstellentests, Zeitpuffer im Projektplan
Budgetüberschreitung	Niedrig	Hoch	Klarer Change-Request-Prozess, Budgetreserve einplanen
Störung von Kernprozessen während Go-Live	Niedrig	Hoch	Hypercare-Phase, Rollback-Plan, Go-Live in prozessarmem Zeitraum

Stakeholder-Analyse

Hohe Macht · Hohes Interesse

Geschäftsführung, Projektleitung IT

Hohe Macht · Niedriges Interesse

IT-Infrastruktur, externer SAP-Berater

Niedrige Macht · Hohes Interesse

Einkauf, Lager, Buchhaltung
(Endanwender)

Niedrige Macht · Niedriges Interesse

Externe Lieferanten

Erwarteter Nutzen

Geschätzte Werte für dieses fiktive Fallbeispiel, keine belegten Praxiszahlen.

-40%

geschätzte manuelle
Bearbeitungszeit beim
Rechnungsabgleich

Echtzeit

Bestandstransparenz
statt tagesaktueller
Excel-Listen

-5 Tage

geschätzte Verkürzung
des
Monatsabschlusses

Was ich daraus mitnehme

Am meisten überrascht hat mich beim Erstellen der Risikomatrix, wie stark Akzeptanzprobleme bei Mitarbeitenden das Projektrisiko dominieren, mehr als jedes technische Risiko. Eine ERP-Einführung scheitert selten an der Software, sondern daran, ob die Menschen dahinter mitgenommen werden. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Prozessen, Technik und Menschen will ich später arbeiten.
